



# 第四區管理處 停水作業計畫

工程名稱：太平區正誠街等汰換管線工程(二)  
(第七階段)

台灣自來水公司  
中華民國 114 年 11 月

# 台灣自來水公司第四區管理處停水作業計畫

## 目錄

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、前言 .....                     | 3  |
| 二、施工期間 .....                   | 3  |
| 三、停水日期 .....                   | 3  |
| 四、影響範圍 .....                   | 3  |
| 五、施作流程 .....                   | 3  |
| 六、供水調度因應作為 .....               | 4  |
| 七、停水宣傳方式 .....                 | 4  |
| 八、其他事項 .....                   | 4  |
| 附錄(一) 台灣自來水公司第四區管理處停水報告單 ..... | 5  |
| 附錄(二) 里長及相關單位協調連絡人員表 .....     | 6  |
| 施工及停水訊息 .....                  | 7  |
| 施工地點示意圖 .....                  | 9  |
| 附件一、停水及降壓範圍 .....              | 10 |

## 一、前言

本工程施工地點位於**太平區**，辦理**太平區正誠街等汰換管線工程(二)**，為確保停水作業順暢，擬訂本作業計畫書作為施工依據。

## 二、施工期間

**114 年 11 月 21 日至 114 年 12 月 21 日**，周一至周六當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時，本停水計畫截止日順延。

## 三、停水日期

施工期間內配合工程進度，實際停水日期及時間於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水。

(一)幹管改接工程：影響用戶數約為 2000 戶，每次停水自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。

(二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約 60~100 公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數 10 戶不等)，每戶停水自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。

## 四、影響範圍

### (一)停水範圍(詳附件一)：

太平區：建興里、成功里(部分)、建國里(部分)、平安里(部分)、中平里。

「成功路及成功東路以東、太堤西路以西、東平路以南、太平路以北等一帶。」

### (二)水壓降低範圍(同停水範圍)：


太平區：建興里、成功里(部分)、建國里(部分)、平安里(部分)、中平里。

「成功路及成功東路以東、太堤西路以西、東平路以南、太平路以北等一帶。」

備註：實際停水及水壓降低範圍於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。

## 五、施作流程

規劃預計辦理改善之區域管線設置位置後，報陳相關單位核定後，據以進場施作。現場施工順序如下：



## 六、供水調度因應作為

- (一)送水車按規劃路線填滿臨時供水站，並於復水前，裝滿管線末端與地勢較高致復水較慢地區用戶使用。
- (二)停水前應先儲滿各蓄（配）水池。
- (三)先將停水區內低地區與大用戶（每月用水超過一千度之非工業用水戶）、工業用水戶，有大蓄水池容易進水之管線先行關閉，盡量保持主幹管內之水量與水壓。
- (四)每日統計各項限水數據（用戶查詢電話、載水次數與數量等）。
- (五)載水站、載水車之指揮與管理。

## 七、停水宣傳方式

撰寫停復水施工停水訊息單，並於本公司網站上刊登停限水訊息，配合停水簡訊發送…等方式，告知用戶停水時程、停（復）水時應注意事項。

## 八、其他事項

- (一)為配合飲用水條例施行，施工完成後請加強排水清洗，以維用水品質，如因清洗不完全，所造成之損失，由承商負責。
- (二)承商先行規劃車行路線，置好交通錐、警示燈等措施，引導車輛行進方向，施工時應依規定作好一切工安措施，以確保工程及人員安全。
- (三)非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水，自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分，請用戶利用晚上儲水備用。
- (四)水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，適逢用水尖峰期，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，故管線末端或巷弄區域，擬依情況延後 2~4 小時恢復供水，敬請見諒。
- (五)敬請影響地區用戶儲水備用，節約使用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過熱損壞，施工、停水期間造成不便之處，敬請見諒。

# 台灣自來水公司第四區管理處停水報告單

(實際停水日期依工程進度刊登於本公司停水公告)

| 項 目       | 內 容                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、工程名稱    | 太平區正誠街等汰換管線工程(二)【RC-114-0401-0011】                                                                                                                                                                                                                |
| 二、施工地點及期間 | 施工地點：台中市太平區<br>施工期間自 114 年 11 月 21 日至 114 年 12 月 21 日，周一至周六<br>當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。                                                                                                                                                            |
| 三、停水原因    | 辦理太平區正誠街等汰換管線工程(二)路口改接(第七階段)                                                                                                                                                                                                                      |
| 四、停水日期    | 施工期間內配合工程進度，實際停水日期及時間於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶改接時停水。<br>(一)幹管改接工程：影響用戶數約為 2000 戶，每次停水自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。<br>(二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約 60~100 公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數 10 戶不等)，每戶停水自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。                          |
| 五、影響範圍    | <b>停水範圍(詳附件一)：</b><br>太平區：建興里、成功里(部分)、建國里(部分)、平安里(部分)、中平里。<br>「成功路及成功東路以東、太堤西路以西、東平路以南、太平路以北等一帶。」<br><b>水壓降低範圍(同停水範圍)：</b><br>太平區：建興里、成功里(部分)、建國里(部分)、平安里(部分)、中平里。<br>「成功路及成功東路以東、太堤西路以西、東平路以南、太平路以北等一帶。」<br>備註：實際停水及水壓降低範圍於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。 |
| 六、減少供水量   | 預計減少供水量：2000 立方公尺。                                                                                                                                                                                                                                |
| 七、影響戶數    | (一)幹管改接工程：約為 2000 戶。<br>(二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約 60~100 公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數 10 戶不等)。                                                                                                                                                               |
| 備 註       | (一)倘遇雨或因特殊原因發生無法施工可能取消停水，待下次停水日期決定後，當再行通知。<br>(二)如工程提早完成則提早供水，倘工作發生特殊困難亦可能略延緩供水，停水不便之處，敬請見諒。<br>(三)若有任何停水問題請電洽(大里服務所：04-24821831；台中給水廠：04-22442469；1910)或上本公司停水公告系統查詢。                                                                            |

廠所：台中給水廠

區處 ☐操作課 ☐業務課： 處長：

附錄(二) 里長及相關單位協調連絡人員表

台灣自來水公司第四區管理處「**太平區正誠街等汰換管線工程(二)**」

里長及相關單位協調連絡人員表

| 項目 | 里別及相關單位    | 里長及連絡人 | 聯絡電話         | 連絡地址                   | 備註 |
|----|------------|--------|--------------|------------------------|----|
| 1  | 建興里        | 胡長志    | (04)22786577 | 臺中市太平區建興里鵬儀路 471 號     |    |
| 2  | 成功里        | 洪大鈞    | (04)22763758 | 臺中市太平區成功里 2 鄰東平路 155 號 |    |
| 3  | 建國里        | 江德海    | (04)22731647 | 臺中市太平區建國里建功街 21 號      |    |
| 4  | 平安里        | 施秀彩    | (04)22772325 | 臺中市太平區太平里太平十九街 26 號    |    |
| 5  | 中平里        | 林碧森    | (04)22750039 | 臺中市太平區中平里中平路 169 號     |    |
| 6  | 台中給水廠廠長    | 孫智強    | (04)22442469 | 臺中市遼寧路一段三號             |    |
| 7  | 台中給水廠工務股股長 | 許喬宇    | (04)22442469 | 臺中市遼寧路一段三號             |    |
| 8  | 台中給水廠監造人員  | 賴淑貞    | (04)22442469 | 臺中市遼寧路一段三號             |    |
| 9  | 得意營造有限公司   | 巫俊德    | (04)23829246 | 臺中市大里區永大街 469 號        |    |
| 10 | 欣林瓦斯       |        | (04)24924760 | 台中市大里區大峰路 495 號        |    |
| 11 | 台電         |        | (04)24924760 |                        |    |
| 12 | 中華電信       |        | (04)22918175 |                        |    |
| 13 |            |        |              |                        |    |
| 14 |            |        |              |                        |    |

# 台灣自來水公司第四區管理處

## ◎ 施工及停水訊息 ◎

### 一、施工及停水緣由：

本公司為提供量足質優自來水，以提升民眾用水品質，辦理「**太平區正誠街等汰換管線工程(二)**」，管線改接施工時，將造成部份區域停水，其停水區域、時間詳述於後。

### 二、施工期間：

**114 年 11 月 21 日至 114 年 12 月 21 日**，周一至周六當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時，本停水計畫截止日順延。

### 三、停水日期：

施工期間內配合工程進度，實際停水日期及時間於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶改接時停水。

(一)幹管改接工程：影響用戶數約為 2000 戶，每次停水自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。

(二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約 60~100 公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數 10 戶不等)，每戶停水自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。

### 四、影響範圍：

#### (一)停水範圍(詳附件一)：

太平區：建興里、成功里(部分)、建國里(部分)、平安里(部分)、中平里。

「成功路及成功東路以東、太堤西路以西、東平路以南、太平路以北等一帶。」

#### (二)水壓降低範圍(同停水範圍)：

太平區：建興里、成功里(部分)、建國里(部分)、平安里(部分)、中平里。

「成功路及成功東路以東、太堤西路以西、東平路以南、太平路以北等一帶。」


1. 實際停水及水壓降低範圍於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。
2. 施工期間受制水閥關閉影響，施工周邊地區管線壓力可能降低，部分地區管線末端可能有無水情況發生。
3. 影響時間：每日上午 8 時 30 分至下午 20 時 30 分，預計降壓 12 小時，管線巷道末端將延後 2 小時恢復。

註：水量輸送過程及復水調配水量須分段排氣，另恢復供水時，大樓及用戶配水池、水塔須補滿水量，故管線末端及巷弄恢復時間將略為延後。敬請影響地區用戶儲水備用、配合節約用水、**關閉抽水馬達電源**，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災並請飲用前先煮沸，造成不便之處，敬請見諒。

五、查詢電話：

|                           |               |       |                |
|---------------------------|---------------|-------|----------------|
| 台中給水廠                     | (04)2244-2469 | 大里服務所 | (04) 2482-1831 |
| 施工進度查詢<br>得意營造有限公司王先<br>生 | 0933-510153   | 客服中心  | 1910           |

# 施工地點範圍簡示圖

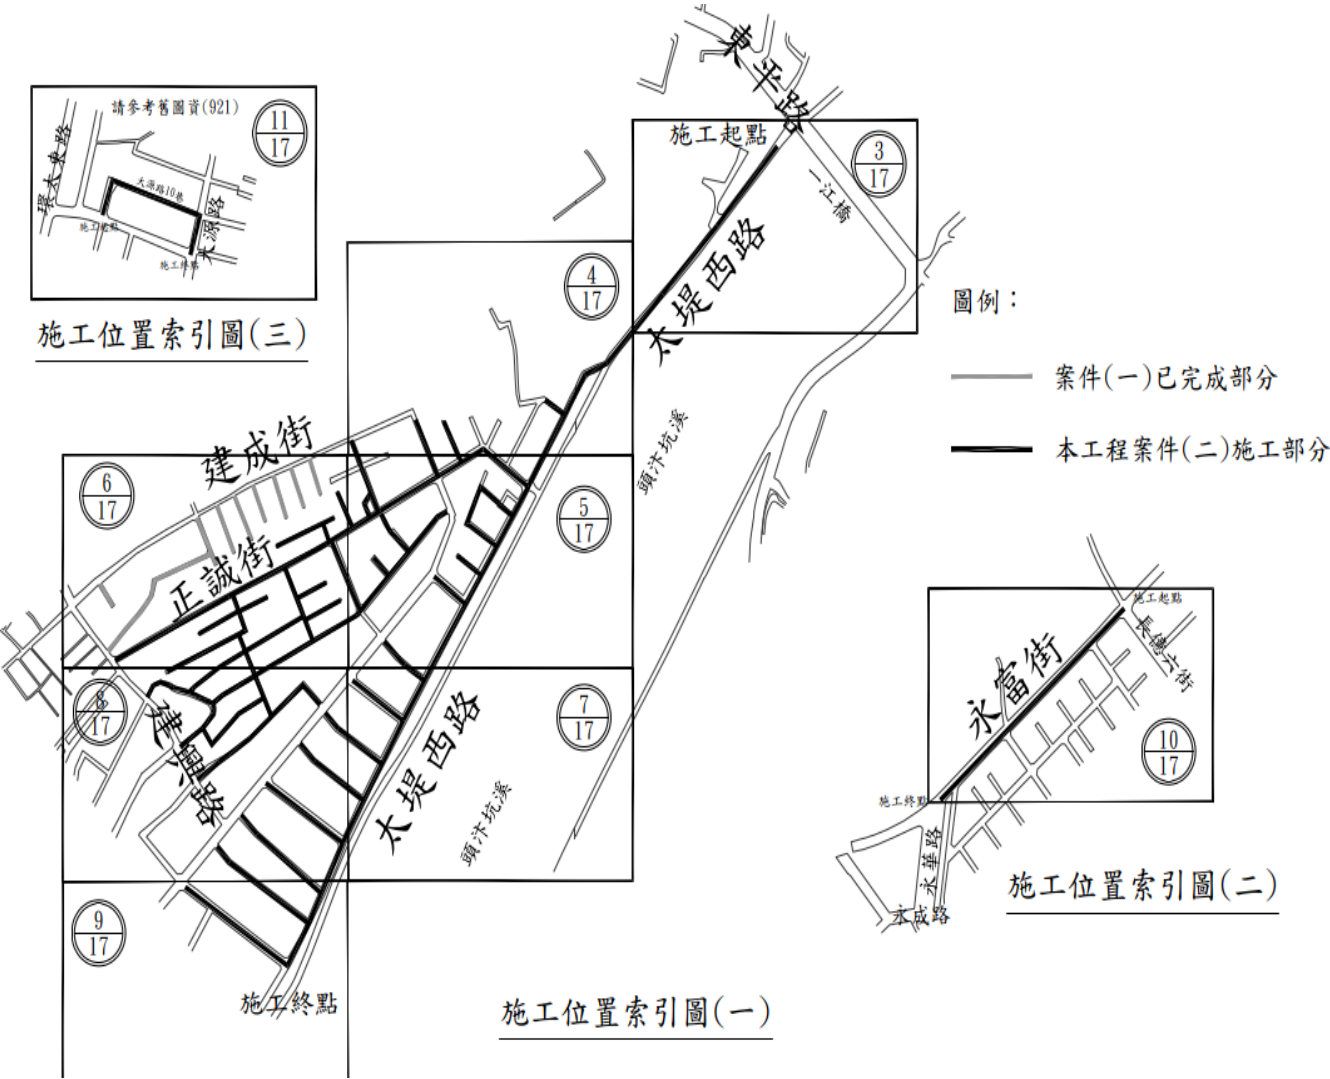

## 施工可能造成停水及水壓降低之影響範圍

(紅線內)



施工可能造成停水及水壓降低之影響範圍：

太平區：建興里、成功里(部分)、建國里(部分)、平安里(部分)、中平里。  
「成功路及成功東路以東、太堤西路以西、東平路以南、太平路以北等一帶」。

備註：實際停水日期及範圍依工程進度刊登於本公司停水公告，非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水。

相關停水訊息請搜尋本公司停水公告查詢系統：<https://web.water.gov.tw/wateroff/>

欲訂閱停水通知，可掃描 Line QR code 或輸入電子信箱

台灣自來水公司 TAIWAN WATER CORPORATION

停水公告查詢系統

澎湖縣

基隆市

桃園市

新北市

新竹市

新竹縣

苗栗縣

宜蘭縣

臺中市

彰化縣

南投縣

雲林縣

嘉義市

嘉義縣

臺南市

高雄市

屏東縣

花蓮縣

臺東縣

△ 紅色表示該縣市有災害停水事件

■ 綠色表示區域供水正常

● 黃色表示該縣市部分地區有停水或降壓事件

☎ 24小時客服專線: 1910

申請停水通知 (另開新視窗)

地圖資訊版 (另開新視窗)

臨時供水站查詢 (另開新視窗)

供水現況回報 (另開新視窗)

民眾接收停水通知資訊

您可以掃描 Line QR code 訂閱停水通知

手機可直接點選[連結](#)

OR

輸入信箱登入或註冊

Mail

確定

☆ : ✕

停水公告

★ 台水公司停水公告查詢系統

好友人數 283,368

聊天 貼文

TaiwanWater @586zvzut

搜尋官方帳號

查看一覽 透過我的優惠券搜尋 用姓名搜尋
