



第四區管理處 停水作業計畫

工程名稱：太平區正誠街等汰換管線工程(二)
(第八階段)

台灣自來水公司
中華民國 114 年 11 月

台灣自來水公司第四區管理處停水作業計畫

目錄

一、前言	3
二、施工期間	3
三、停水日期	3
四、影響範圍	3
五、施作流程	3
六、供水調度因應作為	4
七、停水宣傳方式	4
八、其他事項	4
附錄(一) 台灣自來水公司第四區管理處停水報告單	5
附錄(二) 里長及相關單位協調連絡人員表	6
施工及停水訊息	7
施工地點示意圖	9
附件一、停水及降壓範圍	10

一、前言

本工程施工地點位於太平區，辦理**太平區正誠街等汰換管線工程(二)**，為確保停水作業順暢，擬訂本作業計畫書作為施工依據。

二、施工期間

115年01月05日至115年02月05日，周一至周六當日8時30分至18時30分。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時，本停水計畫截止日順延。

三、停水日期

施工期間內配合工程進度，實際停水日期及時間於停水2天前刊登本公司停水公告查詢系統。非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水。

(一)幹管改接工程：影響用戶數約為2000戶，每次停水自當日8時30分至18時30分。

(二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約60~100公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數10戶不等)，每戶停水自當日8時30分至18時30分。

四、影響範圍

(一)停水範圍(詳附件一)：

太平區：建興里、成功里(部分)、建國里(部分)、平安里(部分)、中平里。

「成功路及成功東路以東、太堤西路以西、東平路以南、太平路以北等一帶。」

(二)水壓降低範圍(同停水範圍)：


太平區：建興里、成功里(部分)、建國里(部分)、平安里(部分)、中平里。

「成功路及成功東路以東、太堤西路以西、東平路以南、太平路以北等一帶。」

備註：實際停水及水壓降低範圍於停水2天前刊登本公司停水公告查詢系統。

五、施作流程

規劃預計辦理改善之區域管線設置位置後，報陳相關單位核定後，據以進場施作。現場施工順序如下：



六、供水調度因應作為

- (一)送水車按規劃路線填滿臨時供水站，並於復水前，裝滿管線末端與地勢較高致復水較慢地區用戶使用。
- (二)停水前應先儲滿各蓄（配）水池。
- (三)先將停水區內低地區與大用戶（每月用水超過一千度之非工業用水戶）、工業用水戶，有大蓄水池容易進水之管線先行關閉，盡量保持主幹管內之水量與水壓。
- (四)每日統計各項限水數據（用戶查詢電話、載水次數與數量等）。
- (五)載水站、載水車之指揮與管理。

七、停水宣傳方式

撰寫停復水施工停水訊息單，並於本公司網站上刊登停限水訊息，配合停水簡訊發送…等方式，告知用戶停水時程、停（復）水時應注意事項。

八、其他事項

- (一)為配合飲用水條例施行，施工完成後請加強排水清洗，以維用水品質，如因清洗不完全，所造成之損失，由承商負責。
- (二)承商先行規劃車行路線，置好交通錐、警示燈等措施，引導車輛行進方向，施工時應依規定作好一切工安措施，以確保工程及人員安全。
- (三)非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水，自當日8時30分至18時30分，請用戶利用晚上儲水備用。
- (四)水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，適逢用水尖峰期，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，故管線末端或巷弄區域，擬依情況延後2~4小時恢復供水，敬請見諒。
- (五)敬請影響地區用戶儲水備用，節約使用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過熱損壞，施工、停水期間造成不便之處，敬請見諒。

台灣自來水公司第四區管理處停水報告單

(實際停水日期依工程進度刊登於本公司停水公告)

項 目	內 容
一、工程名稱	太平區正誠街等汰換管線工程(二)【RC-114-0401-0011】
二、施工地點及期間	施工地點：台中市太平區 施工期間自 115 年 01 月 05 日至 115 年 02 月 05 日，周一至周六 當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。
三、停水原因	辦理太平區正誠街等汰換管線工程(二)路口改接(第八階段)
四、停水日期	施工期間內配合工程進度，實際停水日期及時間於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶改接時停水。 (一)幹管改接工程：影響用戶數約為 2000 戶，每次停水自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。 (二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約 60~100 公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數 10 戶不等)，每戶停水自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。
五、影響範圍	停水範圍(詳附件一)： 太平區：建興里、成功里(部分)、建國里(部分)、平安里(部分)、中平里。 「成功路及成功東路以東、太堤西路以西、東平路以南、太平路以北等一帶。」 水壓降低範圍(同停水範圍)： 太平區：建興里、成功里(部分)、建國里(部分)、平安里(部分)、中平里。 「成功路及成功東路以東、太堤西路以西、東平路以南、太平路以北等一帶。」 備註：實際停水及水壓降低範圍於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。
六、減少供水量	預計減少供水量：2000 立方公尺。
七、影響戶數	(一)幹管改接工程：約為 2000 戶。 (二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約 60~100 公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數 10 戶不等)。
備 註	(一)倘遇雨或因特殊原因發生無法施工可能取消停水，待下次停水日期決定後，當再行通知。 (二)如工程提早完成則提早供水，倘工作發生特殊困難亦可能略延緩供水，停水不便之處，敬請見諒。 (三)若有任何停水問題請電洽(大里服務所：04-24821831；台中給水廠：04-22442469；1910)或上本公司停水公告系統查詢。

廠所：台中給水廠 區處 操作課 業務課： 處長：

附錄(二) 里長及相關單位協調連絡人員表

台灣自來水公司第四區管理處「太平區正誠街等汰換管線工程(二)
里長及相關單位協調連絡人員表

項目	里別及相關單位	里長及連絡人	聯絡電話	連絡地址	備註
1	建興里	胡長志	(04)22786577	臺中市太平區建興里鵬儀路 471 號	
2	成功里	洪大鈞	(04)22763758	臺中市太平區成功里 2 鄰東平路 155 號	
3	建國里	江德海	(04)22731647	臺中市太平區建國里建功街 21 號	
4	平安里	施秀彩	(04)22772325	臺中市太平區太平里太平十九街 26 號	
5	中平里	林碧森	(04)22750039	臺中市太平區中平里中平路 169 號	
6	台中給水廠廠長	孫智強	(04)22442469	臺中市遼寧路一段三號	
7	台中給水廠工務股股長	許喬宇	(04)22442469	臺中市遼寧路一段三號	
8	台中給水廠監造人員	賴淑貞	(04)22442469	臺中市遼寧路一段三號	
9	得意營造有限公司	巫俊德	(04)23829246	臺中市大里區永大街 469 號	
10	欣林瓦斯		(04)24924760	台中市大里區大峰路 495 號	
11	台電		(04)24924760		
12	中華電信		(04)22918175		
13					
14					

台灣自來水公司第四區管理處

◎ 施工及停水訊息 ◎

一、施工及停水緣由：

本公司為提供量足質優自來水，以提升民眾用水品質，辦理「太平區正誠街等汰換管線工程(二)」，管線改接施工時，將造成部份區域停水，其停水區域、時間詳述於後。

二、施工期間：

115年01月05日至115年02月05日，周一至周六當日8時30分至18時30分。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時，本停水計畫截止日順延。

三、停水日期：

施工期間內配合工程進度，實際停水日期及時間於停水2天前刊登本公司停水公告查詢系統。非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶改接時停水。

(一)幹管改接工程：影響用戶數約為2000戶，每次停水自當日8時30分至18時30分。

(二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約60~100公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數10戶不等)，每戶停水自當日8時30分至18時30分。

四、影響範圍：

(一)停水範圍(詳附件一)：

太平區：建興里、成功里(部分)、建國里(部分)、平安里(部分)、中平里。

「成功路及成功東路以東、太堤西路以西、東平路以南、太平路以北等一帶。」

(二)水壓降低範圍(同停水範圍)：

太平區：建興里、成功里(部分)、建國里(部分)、平安里(部分)、中平里。

「成功路及成功東路以東、太堤西路以西、東平路以南、太平路以北等一帶。」


1. 實際停水及水壓降低範圍於停水2天前刊登本公司停水公告查詢系統。
2. 施工期間受制水閥關閉影響，施工周邊地區管線壓力可能降低，部分地區管線末端可能有無水情況發生。
3. 影響時間：每日上午8時30分至下午20時30分，預計降壓12小時，管線巷道末端將延後2小時恢復。

註：水量輸送過程及復水調配水量須分段排氣，另恢復供水時，大樓及用戶配水池、水塔須補滿水量，故管線末端及巷弄恢復時間將略為延後。敬請影響地區用戶儲水備用、配合節約用水、**關閉抽水馬達電源**，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災並請飲用前先煮沸，造成不便之處，敬請見諒。

五、查詢電話：

台中給水廠	(04)2244-2469	大里服務所	(04) 2482-1831
施工進度查詢 得意營造有限公司王先生	0933-510153	客服中心	1910

施工地點範圍簡示圖

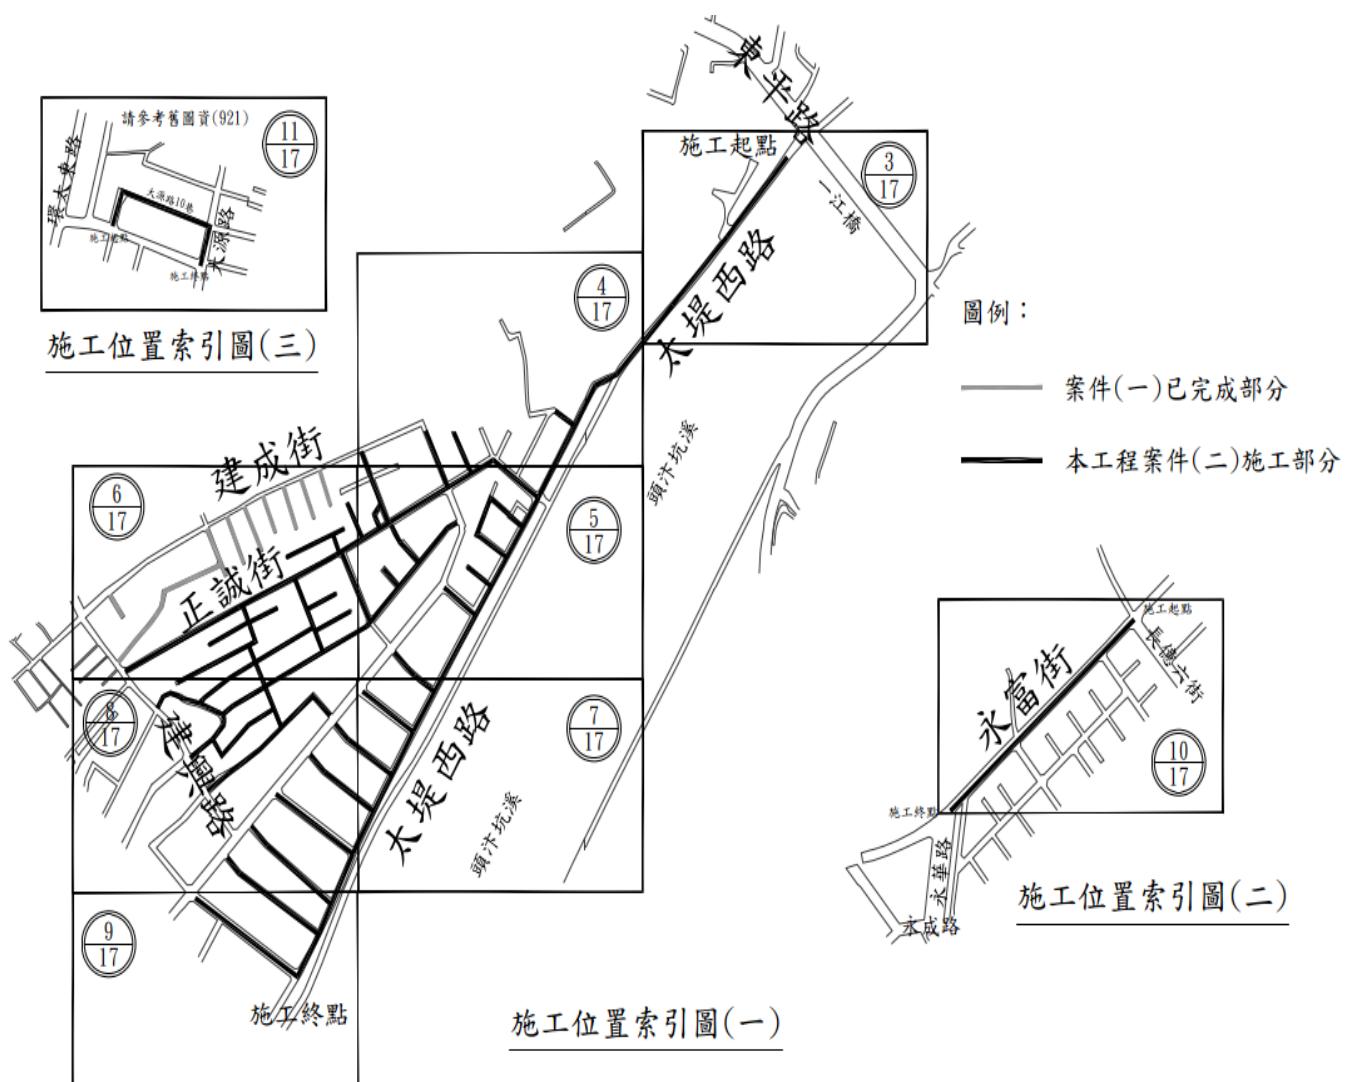

施工可能造成停水及水壓降低之影響範圍

(紅線內)



施工可能造成停水及水壓降低之影響範圍：

太平區：建興里、成功里(部分)、建國里(部分)、平安里(部分)、中平里。

「成功路及成功東路以東、太堤西路以西、東平路以南、太平路以北等一帶」。

備註：實際停水日期及範圍依工程進度刊登於本公司停水公告，非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水。

相關停水訊息請搜尋本公司停水公告查詢系統：<https://web.water.gov.tw/wateroff/>

欲訂閱停水通知，可掃描 Line QR code 或輸入電子信箱



民眾接收停水通知資訊

您可以掃描 Line QR code 訂閱停水通知

手機可直接點選[連結](#)

OR

輸入信箱登入或註冊

Mail

確定

台水公司停水公告查詢系統

好友人數 283,368

TaiwanWater
@586zvzut

聊天 貼文

搜尋官方帳號

查看一覽 透過我的優惠券搜尋 用姓名搜尋
